PAW

Lic. en Sistemas de Información

Trabajo Práctico Final

Integrador de Conocimientos

Integrantes:

Abril Babino, Naiara Collazo y Tobias Avila

Propuesta General de la Aplicación - PawMap

1. Objetivo

Desarrollar una aplicación web PawMap orientada a la adopción de perros y gatos. La plataforma permitirá a los usuarios explorar mascotas disponibles mediante un mapa interactivo, filtrar por ubicación, especie, tamaño, edad, y temperamento, y realizar interacciones virtuales básicas con cada perro o gato mediante fotos, videos y animación.

2. Alcance Funcional

PawMap incluirá las siguientes funcionalidades:

- Registro y autenticación de usuarios y refugios, con roles diferenciados.
- Perfil de usuario con información personal, historial de perros y gatos favoritos y solicitudes de adopción.
- Perfil de cada animal con información detallada, multimedia y animaciones interactivas.
- Mapa interactivo (desarrollado mediante la integración de la API de Google Maps) que muestra perros y gatos disponibles según ubicación, con filtros por criterios definidos.
- Panel de administración para refugios, permitiendo agregar, editar y eliminar perfiles de perros y gatos.
- Formulario de contacto o solicitud de adopción para que los usuarios puedan comunicarse con los refugios.
-Test de compatibilidad entre usuarios y mascotas, a partir de preguntas sobre estilo de vida, espacio disponible, genera sugerencias de perros que mejor se ajustan al perfil del adoptante.

3. Presupuesto Temporal

Planificación del proyecto y sitemap: 3 horas
Wireframes (homepage, páginas y formularios): 5 horas
Arquitectura de la aplicación y modelo de objetos: 15 horas
Registro / autenticación de usuarios: 6 horas
Perfil de usuario: 10 horas
Perfil de mascotas: 12 horas
Mapa interactivo de adopciones: 25 horas
Panel de administración de refugios: 15 horas
Solicitudes de adopción / contacto: 10 horas
Test de compatibilidad entre dueños y mascotas: 5 horas
Testing y QA: 10 horas
Despliegue y ajustes finales: 5 horas

Total estimado: 121 horas

Semana 1 – hasta 27/3 (1ra entrega)
Definición de la propuesta general de PawMap, elaboración del presupuesto funcional y temporal, y planteo del sitemap inicial del sitio web.

Semanas 2 y 3 – hasta 10/4 (2da entrega)
Diseño de wireframes del sitio web (Inicio, mapa interactivo, adoptar mascotas, cómo adoptar, refugios, contacto, test de compatibilidad, perfil de usuario, donar y formularios de adopción). Definición de la arquitectura de la aplicación y del modelo de objetos del sistema.

Semanas 4 a 7 – hasta 8/5 (3ra entrega)
Implementación de funcionalidades mínimas end-to-end acordadas con los docentes. Desarrollo inicial del sistema incluyendo interfaz, perfiles de perros y gatos, registro y autenticación de usuarios, visualización básica del mapa interactivo y primera versión del test de compatibilidad entre dueños y mascotas.

Semanas 8 a 11 – hasta 5/6 (4ta entrega)
Incorporación de funcionalidades adicionales, mejoras en la interfaz, implementación del panel de administración de refugios, solicitudes de adopción y mejoras al sistema de recomendación basado en el test de compatibilidad.

Semana 12 – Entrega final
Ajustes finales, pruebas completas del sistema, despliegue de la aplicación y preparación de la presentación para la exposición del proyecto.
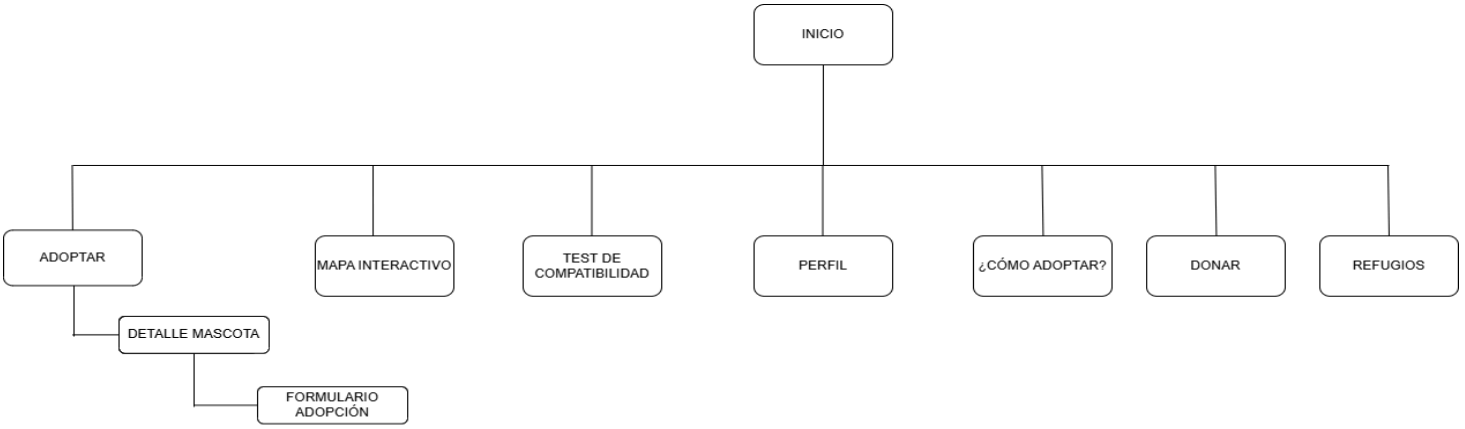
4. SiteMap Inicial
